

[garagekomplekt.ru](http://garagekomplekt.ru)

## СМЕТА НА ГАРАЖ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Адрес: д. Рождественно

Заказчик:



**Расчёт стоимости на следующем листе**



**Внешние габариты гаража. Двускатная крыша:**


<b>Высота (в коньке) (м)</b>	<b>6</b>
<b>Высота (боковые стены) (м)</b>	<b>4,8</b>
<b>Длина (боковые стены) (м)</b>	<b>10</b>
<b>Ширина (фасад, задняя часть) (м)</b>	<b>10</b>

<b>Проём ворот, количество (шт):</b>	<b>Ширина ворот</b>	<b>Высота ворот</b>
2	3	3

Смета	Объём	Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 100мм (утеплитель минеральная вата), цвет: RAL 9006 (серебро) (м2)	198	520740
Сэндвич-панель кровельная, толщина 120мм (утеплитель минеральная вата), цвет: RAL 8017 (коричневый) (м2)	120	354000
<b>Металлический каркас:</b> - Фермы 80*80*3 - Стойки 120*120*3 - Прогоны 80*80*3 *все сечения металлокаркаса будут уточняться при проектировании	4,00	420000
Ворота секционные , Doorhan, размер 3000*3000, высокий подъем ворот до уровня 4,5м от пола (толщина полотна 4см, утеплитель пенополиуретан) цвет: RAL 8017 (коричневый)	2	215000
Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) (м), цвет: RAL 8017 (коричневый)	158	71190
Расходные элементы (анкера, отрезные круги, электроды, саморезы для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон , монтажная пена, уплотнительная лента, грунт ГФ021)		77312
Доставка , 2 рейса (км)	110	27200
<b>Работы:</b> -Проектирование -Монтаж металлокаркаса -Монтаж сэндвич панелей -Монтаж нащельников -Монтаж секционных ворот -Вывоз мусора		479818
<b>Итого</b>		<b>2 165 260</b>


Дополнительные работы/оборудование:	Объём	Стоимость
Окно ПВХ, размер 600*1000, откидное, нащельники	3	22500
Дверь гаражная, металлическая (толщина полотна 6см, металл 1мм, утеплитель пенополистерол) размеры 2050*960, нащельники, цвет: RAL 8017 (коричневый)	1	14000
Монолитные работы (цоколь/лента на существующий фундамент), габариты ширина 0,4м, высота 0,1м, бетон М300, закладные 13шт лист металла 10мм, арматура сетка 150*150 из арматуры 10, опалубка , прогревочный провод КБДС40, работы.	1	91040
Водосток Grand Line ( комплект желобов, труба водосточная, колено, крепеж желоба, крепеж трубы, соединительные муфты), м. пог.	25,6	38400
Вальный привод Shaft-20 KIT, установка слева,2шт пульт управления.	2	84200
Монтажные работы:		51600
<b>Итого</b>		<b>301 740</b>

<b>Итого стоимость гаража:</b>	<b>2 467 000</b>
--------------------------------	------------------

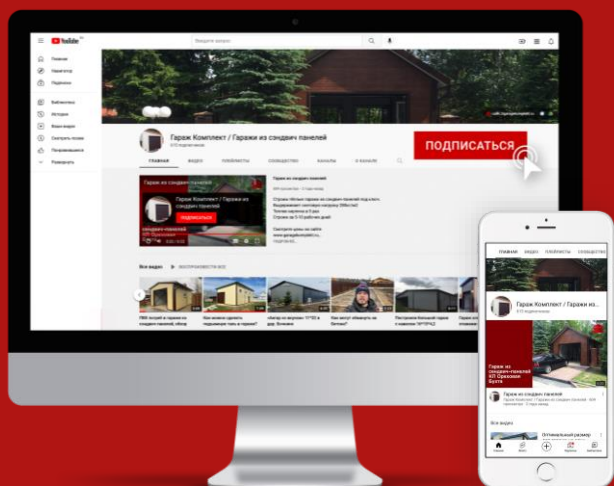

## Некоторые видео о наших гаражах:

Кликните на любое видео и перейдите на наш канал



Большой гараж с жилыми комнатами в центре...

93 просмотра • Неделю назад



Гараж из сэндвич панелей КП Большая Вода

2,9 тыс. просмотров • 3 месяца назад



Гараж из сэндвич-панелей СНТ Золотые Сосны

221 просмотр • 6 месяцев назад



Большой гараж из сэндвич панелей в кп Пестово

974 просмотра • 7 месяцев назад



Ангар из сэндвич панелей д. Малые Вяземы

960 просмотров • 7 месяцев назад



Гараж для ГАЗели из сэндвич-панелей в г....

1,3 тыс. просмотров • 7 месяцев назад

[СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО](#)

