

СМЕТА НА ГАРАЖ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Адрес: Долгопрудный

Заказчик:



Расчёт стоимости на следующем листе



Внешние габариты гаража. Двускатная крыша:	
Высота (в коньке) (м)	4,2
Высота (боковые стены) (м)	3
Длина (боковые стены) (м)	8
Ширина (фасад, задняя часть) (м)	7,5


Проём ворот, количество (шт):	Ширина ворот	Высота ворот
1	5	2,5

Смета	Объём	Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 100мм (утеплитель пенополистерол) цвет снаружи: RAL W004 (античный дуб), цвет внутри: RAL 9003 (белый) (м2)	99	270875
Сэндвич-панель кровельная, толщина 100мм (утеплитель пенополистерол) цвет снаружи и внутри RAL: 8017 (коричневый) (м2)	76	215175
Металлический каркас: - Фермы 80*80*3 - Стойки 120*120*3 - Прогоны 80*80*3 *все сечения металлокаркаса будут уточняться при проектировании (тонн)	2,160	270000
Ворота секционные , Doorhan, размер 5000*2500, (толщина полотна 4см, утеплитель пенополиуретан), цвет: RAL 8017 (коричневый)	1	154400
Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) цвет: RAL 8017 (коричневый) (м)	104	62400
Расходные элементы (отрезные круги, электроды, саморезы для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон , монтажная пена, уплотнительная лента, грунт-эмаль серая)	комплект	49700
Доставка , 2 рейса (км)	80	29520
Работы: -Комплект чертежей -Монтаж металлокаркаса -Монтаж сэндвич панелей -Монтаж нащельников -Монтаж секционных ворот -Вывоз мусора		301550
	Итого	1353620

Дополнительные работы/оборудование:	Объём	Стоимость
Окно ПВХ, размер 1200*1200, глухое/поворотнo-откидное, нащельники, цвет фрамуги окна: RAL 8017 (коричневый)	2	44400
Окно ПВХ, размер 600*1000, откидное, нащельники, цвет фрамуги окна: RAL 8017 (коричневый)	2	31000
Дверь гаражная, металлическая (толщина полотна 6см, металл 1мм, утеплитель пенополистерол) размеры 2050*960, нащельники, цвет: RAL 8017 (коричневый)	1	16000
Фундаментная плита h=200мм, бетон В22,5 (М300), арматура 10 - сетка 200*200 в 2 уровня, геоткань, песок трамбованный h=400мм с коэф. 1,5, смена эксковатора, смена бетононасоса, работы	1	366000
Металлокаркс под лебёдку, монтаж, комплект	1	25000
Водосток Grand Line: (комплект желобов, труба водосточная, колено, крепеж желоба, крепеж трубы, соединительные муфты, снегозадержатели), цвет , м. пог.	30	40500
Потолочный привод SECTIONAL-1000PRO-KIT, L=4200 мм, 2 шт пульта управления	1	20000
Монтажные работы: -Монтаж окна -Монтаж двери -Монтаж водостока -Монтаж электропривода		45000
	Итого	587900

Итого стоимость гаража:	1941520
--------------------------------	----------------

Количество дней монтажа коробки гаража	17
--	----

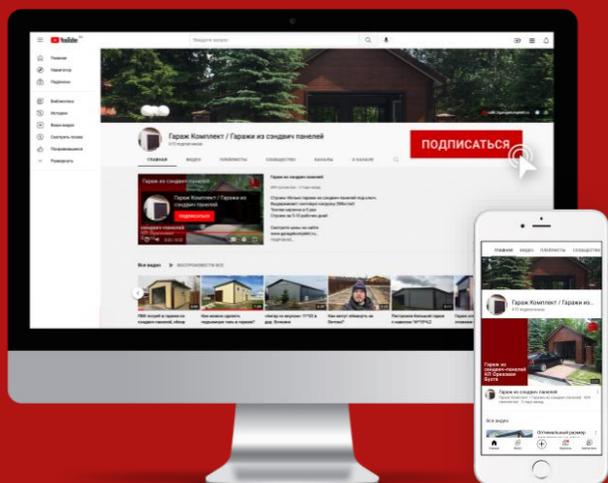

Некоторые видео о наших гаражах:

Кликните на любое видео и перейдите на наш канал



Большой гараж с жилыми комнатами в центре...

93 просмотра • Неделю назад



Гараж из сэндвич панелей КП Большая Вода

2,9 тыс. просмотров • 3 месяца назад



Гараж из сэндвич-панелей СНТ Золотые Сосны

221 просмотр • 6 месяцев назад



Большой гараж из сэндвич панелей в кп Пестово

974 просмотра • 7 месяцев назад



Ангар из сэндвич панелей д. Малые Вяземы

960 просмотров • 7 месяцев назад



Гараж для ГАЗели из сэндвич-панелей в г....

1,3 тыс. просмотров • 7 месяцев назад

[СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО](#)

