



ГАРАЖ-КОМПЛЕКТ
Гаражи и ангары из сэндвич-панелей

+7 (499) 404 03 27
+7 (926) 888 83 54

garagekomplekt.ru

Смета на гараж из сэндвич-панелей включает в себя все материалы, работы и доставку под ключ, кроме фундамента. Вы можете заказать фундамент у нас или сделать его своими руками.

Итого стоимость: 711 952 рублей.



Расчёт стоимости на следующем листе

Эскиз гаража носит ознакомительный характер, заключительное расположение элементов согласовывается на этапе проектирования


Внешние габариты гаража. Двускатная крыша:	
Высота (в коньке) (м)	3
Высота (боковые стены) (м)	2,4
Длина (боковые стены) (м)	7
Ширина (фасад, задняя часть) (м)	5

Проём ворот, количество (шт):	Ширина ворот	Высота ворот
1	3	2,15

Смета	Объём	Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 80мм (утеплитель пенополистерол) цвет: (м2)	57	137160
Сэндвич-панель кровельная, толщина 80мм (утеплитель пенополистерол) цвет: (м2)	47	117500
Металлический каркас: - Фермы 60*60*3 - Стойки 80*80*3 - Прогоны 60*60*3 *все сечения металлокаркаса будут уточняться при проектировании (тонн)	1,155	121275
Ворота секционные, Doorhan, размер 3000*2150, (толщина полотна 4см, утеплитель пенополиуретан)	1	77783
Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) (м)	82,7	49620
Расходные элементы (отрезные круги, электроды, саморезы для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон, монтажная пена, уплотнительная лента, грунт-эмаль серая)	комплект	28423
Доставка, 2 рейса (км)	80	24480
Работы: -Комплект чертежей -Монтаж металлокаркаса -Монтаж сэндвич панелей -Монтаж нащельников -Монтаж секционных ворот -Вывоз мусора		155712
Итого стоимость гаража:		711952


Количество дней монтажа коробки гаража	10
--	----

1. Водосток + монтаж - 38 540 рублей.
2. Фундамент свайно-винтовой + монтаж - 43 200 рублей.
3. Окно 1000x600 фрамуга откидная + монтаж - 11 800 рублей.
4. Дверь металлическая 960x2050 + монтаж - 21 000 рублей.
5. Электропривод секционных ворот + монтаж - 20 500 рублей.
6. Фундамент плита 180мм (бетон М300, арматура 12, песок h=300, геотекстиль, смена эксковатора, работы) - 224 200 рублей.

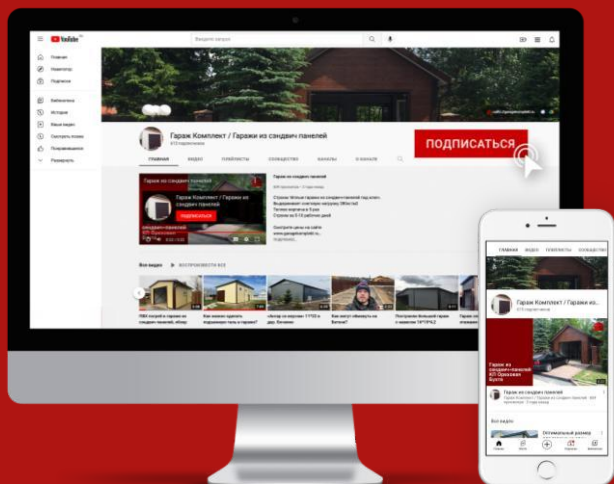

Некоторые видео о наших гаражах:

Кликните на любое видео и перейдите на наш канал



Большой гараж с жилыми комнатами в центре...

93 просмотра • Неделю назад



Гараж из сэндвич панелей КП Большая Вода

2,9 тыс. просмотров • 3 месяца назад



Гараж из сэндвич-панелей СНТ Золотые Сосны

221 просмотр • 6 месяцев назад



Большой гараж из сэндвич панелей в кп Пестово

974 просмотра • 7 месяцев назад



Ангар из сэндвич панелей д. Малые Вяземы

960 просмотров • 7 месяцев назад



Гараж для ГАЗели из сэндвич-панелей в г....

1,3 тыс. просмотров • 7 месяцев назад

[СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО](#)

